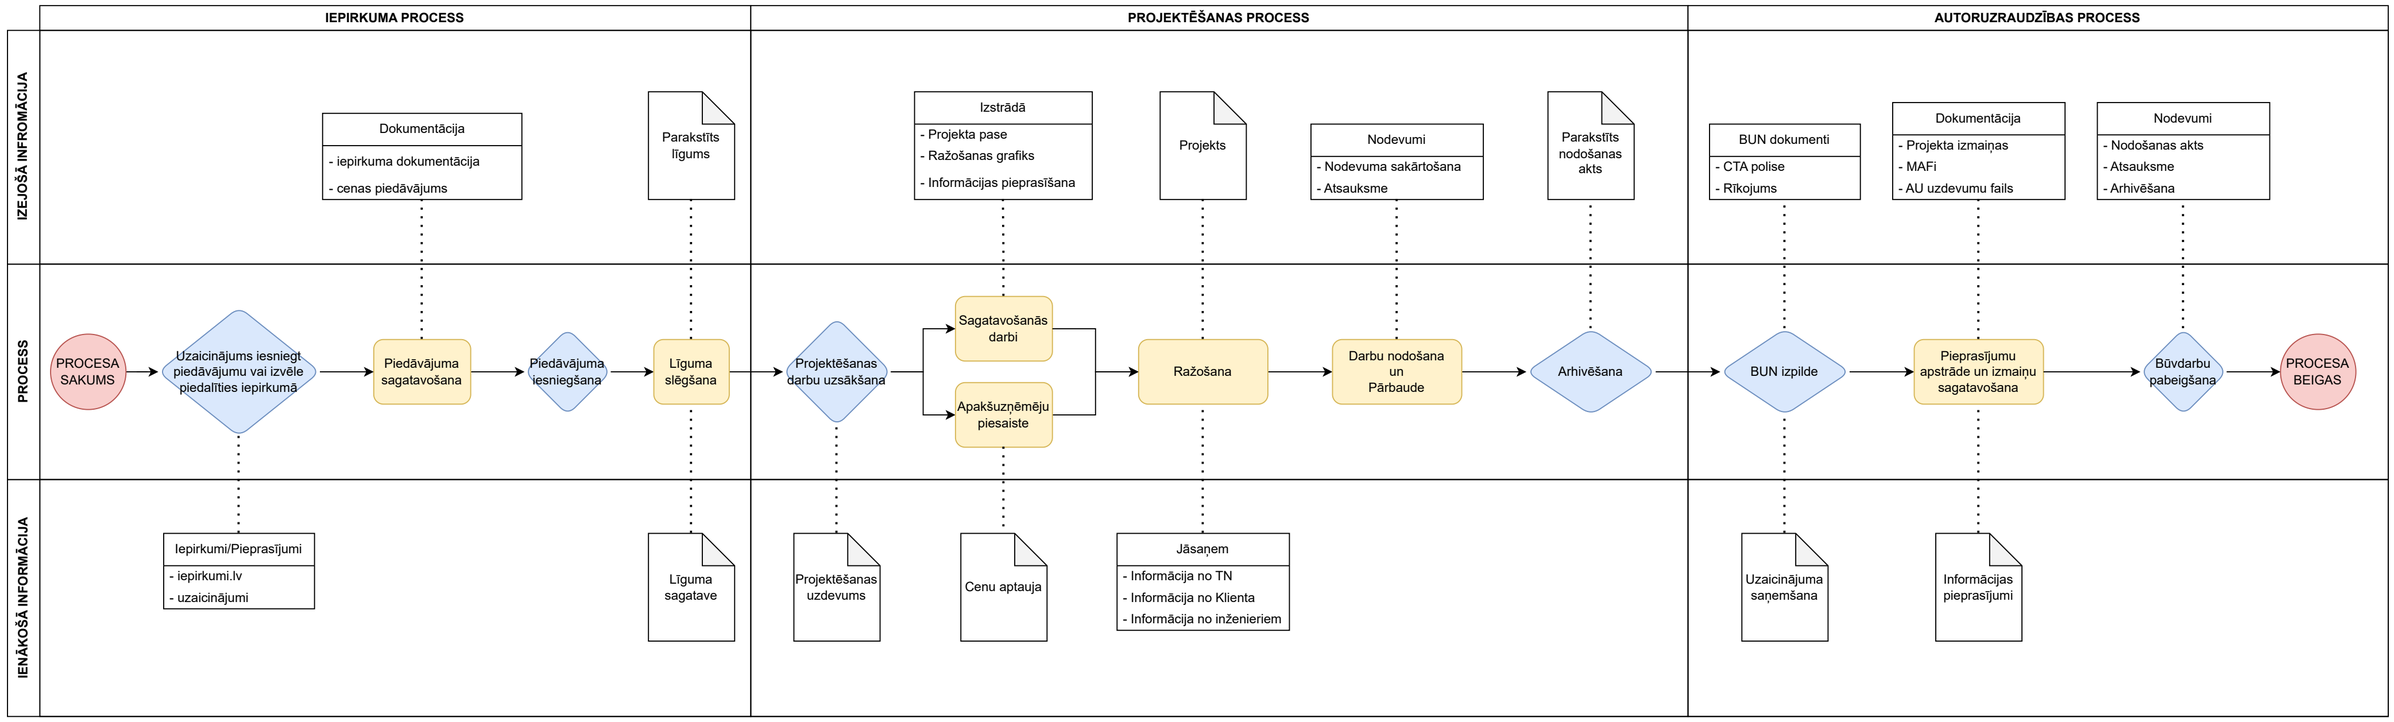

IEPIRKUMA PROCESS
PROJEKTĒŠANAS PROCESS
AUTORUZRAUDZĪBAS PROCESS
IZEJOŠĀ INFROMĀCIJA
PROCESS
IENĀKOŠĀ INFORMĀCIJA
Dokumentācija
- iepirkuma dokumentācija
- cenas piedāvājums
Parakstīts līgums
Izstrādā
- Projekta pase
- Ražošanas grafiks
- Informācijas pieprasīšana
Projekts
Nodevumi
- Nodevuma sakārtošana
- Atsauksme
Parakstīts nodošanas akts
BUN dokumenti
- CTA polise
- Rīkojums
Dokumentācija
- Projekta izmaiņas
- MAFi
- AU uzdevumu fails
Nodevumi
- Nodošanas akts
- Atsauksme
- Arhivēšana
PROCESA SAKUMS
Uzaicinājums iesniegt piedāvājumu vai izvēle piedalīties iepirkumā
Piedāvājuma sagatavošana
Piedāvājuma iesniegšana
Līguma slēgšana
Projektēšanas darbu uzsākšana
Sagatavošanās darbi
Apakšuzņēmēju piesaiste
Ražošana
Darbu nodošana un Pārbaude
Arhivēšana
BUN izpilde
Pieprasījumu apstrāde un izmaiņu sagatavošana
Būvdarbu pabeigšana
PROCESA BEIGAS
Iepirkumi/Pieprasījumi
- iepirkumi.lv
- uzaicinājumi
Līguma sagatave
Projektēšanas uzdevums
Cenu aptauja
Jāsaņem
- Informācija no TN
- Informācija no Klienta
- Informācija no inženieriem
Uzaicinājuma saņemšana
Informācijas pieprasījumi

## PROJEKTU VADĪBA

| GALVENO DARBĪBU APRAKSTS | PROCESS | ATBILDĪGAIS PAR IZPILDI |
|---|---|---|
| **Sākums**<br><br>Vadība nozīmē projektu vadītāju, arhitektu un arhitektūras tehniķi | Projektēšanas darbu uzsākšana | VADĪBA |
| **Sagatavošanās**<br><br>• Līguma nosacījumu izpēte<br>• Nepieciešamo polišu pieprasīšana<br>• PU un citu izsniegto dokumentu izpēte<br>• Informācijas pieprasīšana no klienta<br>• Projekta sastāva sastādīšana<br>• Projektēšanas laika grafika sastādīšana<br>• Iekšējās sapulces rīkošana<br>• Projekta pases sagatavošana | Sagatavošanās darbi | PROJEKTU VADĪTĀJS |
| **Apakšuzņēmēji**<br><br>• Budžeta sastādīšana<br>• Cenu pieprasījumi vismaz 5 piegādātājiem<br>• Cenu aptaujas veidlapas sagatavošana<br>• Darba uzdevumu sagatavošana un parakstīšana | Apakšuzņēmēju piesaiste | PROJEKTU VADĪTĀJS |
| **Ražošana**<br><br>• Skaidru starptermiņu definēšana, katram daļas izstrādātājam<br>• Sapulces ar klientu un protokolēšana<br>• Sapulces ar inženieriem un protokolēšana<br>• Iekšējās sapulce ar arhitektu<br>• Komunikācijas uzturēšana ar instancēm<br>• Izejas informācijas pieprasīšana un nodošana daļu izstrādātājiem<br>• Inženieru savstarpējo uzdevumu tabulas uzturēšana<br>• Tehnikso noteikumu pieprasīšana<br>• Izmaiņu vadība<br>• Risku apzināšana un novēršana<br>• Ekspertīzes labojumu nodošana atbildīgajām personām | Ražošana | PROJEKTU VADĪTĀJS |
| **Darbu nodošana / Pārbaude**<br><br>• Drukātā nodevuma organizēšana un nodošana klientam<br>• Digitālā nodevuma organizēšana un nodošana klientam<br>• Pavadvēstules sagatavošana | Darbu nodošana un Pārbaude | PROJEKTU VADĪTĀJS |
| **Projektēšanas pabeigšana**<br><br>• Nodošanas akta sagatavošana un parakstīšana<br>• Nodošanas aktu saņemšana un parakstīšana no apakšzņēmējiem<br>• Atsauksmes saņemšana<br>• Arhivēšana<br>• Projekta finiša sapulce | Nodošanas akta parakstīšana | PROJEKTU VADĪTĀJS |

## RAŽOŠANA

| GALVENO DARBĪBU APRAKSTS | PROCESS | ATBILDĪGAIS PAR IZPILDI |
|---|---|---|
| **Sākums**<br><br>Vadība nozīmē projketu vadītāju, arhitektu un arhitkektūras tehniķi | Projektēšanas darbu uzsākšana | VADĪBA |
| **Sagatavošanās**<br><br>• PU un citu izsniegto dokumentu izpēte<br>• Jautājumu sagatavošana par darba uzdevumu<br>• Detalizēta rasējumu sastāva sagatavošana BD izstrādājamām daļām<br>• Iekšējā laika grafika sagatavošana un saskaņošana ar projektu vadītāju | Sagatavošanās darbi | ARHITKETS |
| **Apakšuzņēmēji**<br><br>• Projektu vadītāja konsultēšana | Apakšuzņēmēju piesaiste | ARHITKETS |
| **Ražošana**<br><br>• Skaidru starptermiņu ievērošana<br>• Informācijas sagatavošana tehnikso noteikumu pieprasīšanai<br>• Informācijas pieprasīšana un nodošana inženieriem<br>• Piedalīšanās sapulcēs | Ražošana | ARHITKETS |
| **Darbu nodošana / Pārbaude**<br><br>• Drukātā nodevuma sagatavošana<br>• Digitāla nodevuma sagatavošana<br>• Projekta pārbaude BD daļām<br>• Projeketa pārbaude inženierdaļām | Darbu nodošana un Pārbaude | ARHITKETS |
| **Projektēšanas pabeigšana**<br><br>• Piedalīšanās projekta finiša sapulcē | Nodošanas akta parakstīšana | ARHITKETS |

## IEPIRKUMI

| GALVENO DARBĪBU APRAKSTS | PROCESS | ATBILDĪGAIS PAR IZPILDI |
|---|---|---|
| **Sākums**<br><br>Vadība norāda uz iepirkumiem, kuros nolemts startēt un par to paziņo iepirkuma speciālistam | Uzaicinājums iesniegt piedāvājumu vai izvēle piedalīties iepirkumā | VADĪBA |
| **Piedāvājuma sagatavošana**<br><br>• Piereģistrēšana Iepirkumu reģistrā<br>• Nepieciešamās dokumentācijas sagatavošana<br>• Nepieciešamo speciālistu piesaiste<br>• Cenas piedāvājuma sagatavošana | Piedāvājuma sagatavošana | IEPIRKUMU SPECIĀLISTS |
| **Piedāvājuma iesniegšana**<br><br>• Piedāvājuma iesniegšana<br>• Rezultātu fiksēšana Iepirkumu reģistrā<br>• Vadības un Grāmatvedības informēšana par rezultātiem | Piedavajuma iesniegšana | IEPIRKUMU SPECIĀLISTS |
| **Līguma slēgšana**<br><br>• Līguma izskatīšana un komentāru viekšana<br>• Vadības informēšana par riskiem, kas izriet no līguma punktiem<br>• Arhitekta konsultēšana par PU izpēti pirmslīguma stadijā<br>• Līguma parakstīšana nodrošināšana | Līguma parakstīšana | GRĀMATVEDĪBA |

## AUTORUZRAUDZĪBA

| GALVENO DARBĪBU APRAKSTS | PROCESS | ATBILDĪGAIS PAR IZPILDI |
|---|---|---|
| **Sākums**<br><br>Iepirkuma speciālists, Vadība, Projektu vadītājs - Jebkurš, kas saņem infomrāciju par to, ka tiek uzsākti būvdarbi par to paziņo Projektu Koordinatoram | BUN izpilde | PROJEKTU KOORDINATORS |
| **Autoruzraudzība**<br><br>• Piedalīšanās būvsapulcēs<br>• Apakšuzņēmēju piesaiste<br>• Uzdevumu piefikšešana Autoruzraudzības izmaiņu failā un statusu uzturēšana<br>• Uzdevumu nodošana Arhitektam, Arhitektūras tehniķim, Inženieriem<br>• Objekta izbraukumu organizēšana<br>• BIS ierakstu organizēšana un uzraudzīšana<br>• Autoruzraudzības atskaišu sagatavošana un nodošana Grāmatvedībai<br>• Ikmēnēša aktu sagatavošana Pasūtītājam | Pieprasījumu apstrāde un izmaiņu sagatavošana | PROJEKTU KOORDINATORS |
| **Būvdarbu pabeigšana**<br><br>• Gala nodošanas akta sagatvošana un nodošana grāmatvedībai<br>• Nodošana aktu pieprasīšana un saņemšana no apakšuzņēmējiem<br>• Atsauksmes sagatavošana<br>• Arhivēšana | Būvdarbu pabeigšana | PROJEKTU KOORDINATORS |
